




OBRA: "ESCUELA PRIMARIA Nº 133 - AMPLIACION AULAS Y REMODELACION. - PLAZA HUINCUL" - PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

	Nº	ITEM	TAREAS	MONTO	%	MES 1		MES 2	
						%ITEM	%TOTAL	%ITEM	%TOTAL
A- EDIFICIO	1	ALBANILERIA Y AFINES	TRABAJOS PRELIMINARES - DOCUMENTACION TECNICA	200.818,00	0,9776%	80%	0,7821%		0,0000%
			DEMOLICIONES	456.199,40	2,2208%	90%	1,9987%	10%	0,2221%
			MOVIMIENTO DE SUELOS	797.131,00	3,8805%	75%	2,9104%	20%	0,7761%
			HORMIGON ARMADO	1.861.673,50	9,0628%		0,0000%	40%	3,6251%
			CAPAS AISLADORAS	161.070,00	0,7841%		0,0000%	20%	0,1568%
			MAMPOSTERIA	984.904,00	4,7945%		0,0000%	10%	0,4795%
			CUBIERTA DE TECHOS	2.327.620,00	11,3309%		0,0000%		0,0000%
			CONTRAPISOS	810.481,00	3,9454%		0,0000%	20%	0,7891%
			PISOS - ZOCALOS	1.854.851,00	9,0295%		0,0000%		0,0000%
			UMBRALES - ANTEPECHOS	44.900,00	0,2186%		0,0000%		0,0000%
			REVOQUES	910.472,00	4,4322%		0,0000%		0,0000%
			REVESTIMIENTOS	197.120,00	0,9596%		0,0000%		0,0000%
			CIELORRASOS	557.969,00	2,7162%		0,0000%		0,0000%
			CARPINTERIA - AFINES	1.600.502,00	7,7912%		0,0000%		0,0000%
			ESPEJOS	22.659,00	0,1103%		0,0000%		0,0000%
			VARIOS	508.796,00	2,4768%		0,0000%		0,0000%
			PINTURAS	1.099.849,00	5,3541%		0,0000%		0,0000%
	2	INSTALACION SANITARIA	RECEPTACULOS DE ALBAÑILERIA - AFINES	19.669,00	0,0958%	20%	0,0192%	30%	0,0287%
			DESAGÜES CLOACALES	111.432,00	0,5425%		0,0000%		0,0000%
			DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE	141.796,00	0,6904%		0,0000%		0,0000%
			ARTEFACTOS	209.519,00	1,0200%	20%	0,2040%	40%	0,4080%
			GRIFERIA - BRONCERIA	235.855,00	1,1480%		0,0000%		0,0000%
			VARIOS	91.306,00	0,4443%		0,0000%		0,0000%
	3	INSTALACION ELECTRICA	CENTROS	370.739,00	1,8049%		0,0000%		0,0000%
			ARTEFACTOS	496.735,00	2,4181%		0,0000%		0,0000%
			TABLEROS - VARIOS	336.646,00	1,6390%		0,0000%		0,0000%
	4	INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION	EQUIPOS Y ARTEFACTOS	355.987,00	1,7330%		0,0000%		0,0000%
			CONDUCTOS DE CALEFACCION	747.910,00	3,6409%		0,0000%		0,0000%
			CAÑERIAS PARA DISTRIBUCION DE GAS NATURAL	34.096,00	0,1659%		0,0000%		0,0000%
			VARIOS	111.758,00	0,5440%		0,0000%		0,0000%
	5	INSTALACION SEGURIDAD Y CONTRA INCENDIO	BOCAS	166.082,00	0,8084%		0,0000%		0,0000%
			VARIOS	228.311,00	1,1113%		0,0000%		0,0000%
			INCENDIO	283.175,00	1,3785%		0,0000%		0,0000%
B.TRABAJOS EXTERIORES	1	ALBAÑILERIA Y AFINES	VARIOS	1.001.046,00	4,8731%	10%	0,4873%	20%	0,9746%
	2	INSTALACION SANITARIA	VARIOS	800.263,00	3,8958%		0,0000%	25%	0,9740%
	3	INSTALACION ELECTRICA	VARIOS	270.908,00	1,3188%		0,0000%		0,0000%
	4	INSTALACION DE GAS	VARIOS	131.925,00	0,6422%		0,0000%		0,0000%
TOTAL				20.542.172,90	100,0000%				
PORCENTAJE MENSUAL							6,4017%		8,4340%
PORCENTAJE ACUMULADO							6,4017%		14,8357%
TOTAL MENSUAL							1.315.048,28		1.732.526,86
TOTAL ACUMULADO							1.315.048,28		3.047.575,14

MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8	
%ITEM	%TOTAL	%ITEM	%TOTAL	%ITEM	%TOTAL	%ITEM	%TOTAL	%ITEM	%TOTAL	%ITEM	%TOTAL
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	20%	0,1955%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	5%	0,1940%
10%	0,9063%	20%	1,8126%	30%	2,7188%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
80%	0,6273%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
60%	2,8767%	20%	0,9589%	10%	0,4795%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%	30%	3,3993%	50%	5,6655%	20%	2,2662%		0,0000%		0,0000%
40%	1,5782%	40%	1,5782%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%	20%	1,8059%	60%	5,4177%	20%	1,8059%		0,0000%
50%	0,1093%		0,0000%	30%	0,0656%	20%	0,0437%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%	20%	0,8864%	60%	2,4593%	20%	0,8864%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%	30%	0,2879%	30%	0,2879%	40%	0,3838%
	0,0000%	40%	1,0865%	30%	0,8149%	20%	0,5432%	10%	0,2716%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%	20%	1,5582%	40%	3,1165%	40%	3,1165%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%	20%	0,0221%	40%	0,0441%	40%	0,0441%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%	20%	0,4954%	40%	0,9907%	40%	0,9907%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%	30%	1,6062%	30%	1,6062%	40%	2,1416%
30%	0,0287%	20%	0,0192%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	60%	0,3252%	40%	0,2168%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	40%	0,2762%	60%	0,4142%
40%	0,4080%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%	40%	0,4592%	40%	0,4592%		0,0000%		0,0000%	20%	0,2296%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%	20%	0,0889%	30%	0,1333%	50%	0,2222%
20%	0,3610%	40%	0,7220%	40%	0,7220%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	20%	0,4836%	80%	1,9345%
50%	0,8195%	40%	0,6556%	10%	0,1639%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	50%	0,8665%	50%	0,8665%
	0,0000%	50%	1,8205%	50%	1,8205%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%	50%	0,0830%	50%	0,0830%		0,0000%		0,0000%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%	30%	0,1632%	30%	0,1632%	40%	0,2176%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	100%	0,8084%
	0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	80%	0,8890%	20%	0,2223%
	0,0000%		0,0000%	20%	0,2757%	40%	0,5514%	40%	0,5514%		0,0000%
30%	1,4619%	40%	1,9492%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
25%	0,9740%	50%	1,9479%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
20%	0,2638%	40%	0,5275%	40%	0,5275%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
20%	0,1284%	30%	0,1927%	50%	0,3211%		0,0000%		0,0000%		0,0000%

10,5431%	18,0157%	20,1627%	15,5938%	11,8113%	9,0377%
25,3788%	43,3945%	63,5572%	79,1510%	90,9623%	100,0000%
2.165.781,83	3.700.816,24	4.141.856,70	3.203.305,36	2.426.297,67	1.856.539,96
5.213.356,97	8.914.173,21	13.056.029,91	16.259.335,27	18.685.632,94	20.542.172,90

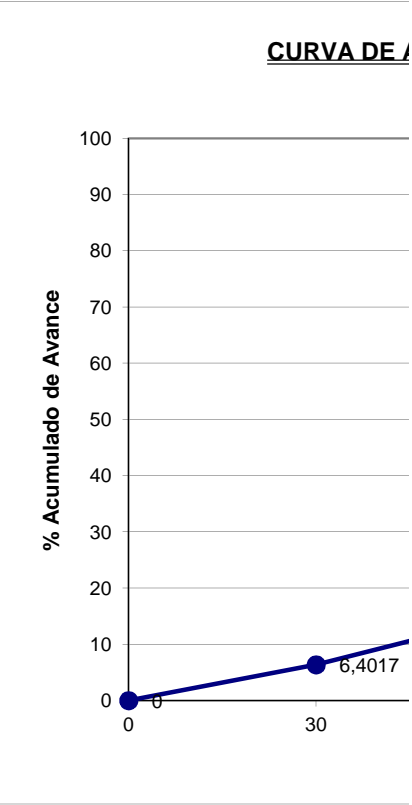

AVANCE ESCUELA PRIMARIA N° 133 - AMPLIACION AULAS Y REMODELACION - PLAZA HUINCUL

